


AI活用を、 PoCプロジェクトへ


NEC FY26 AI推進者向け実践プログラム | 第2回

候補を絞り、成果・仮説・最初の2週間を決める

一般社団法人ビジネスAI推進機構 (BAAO)

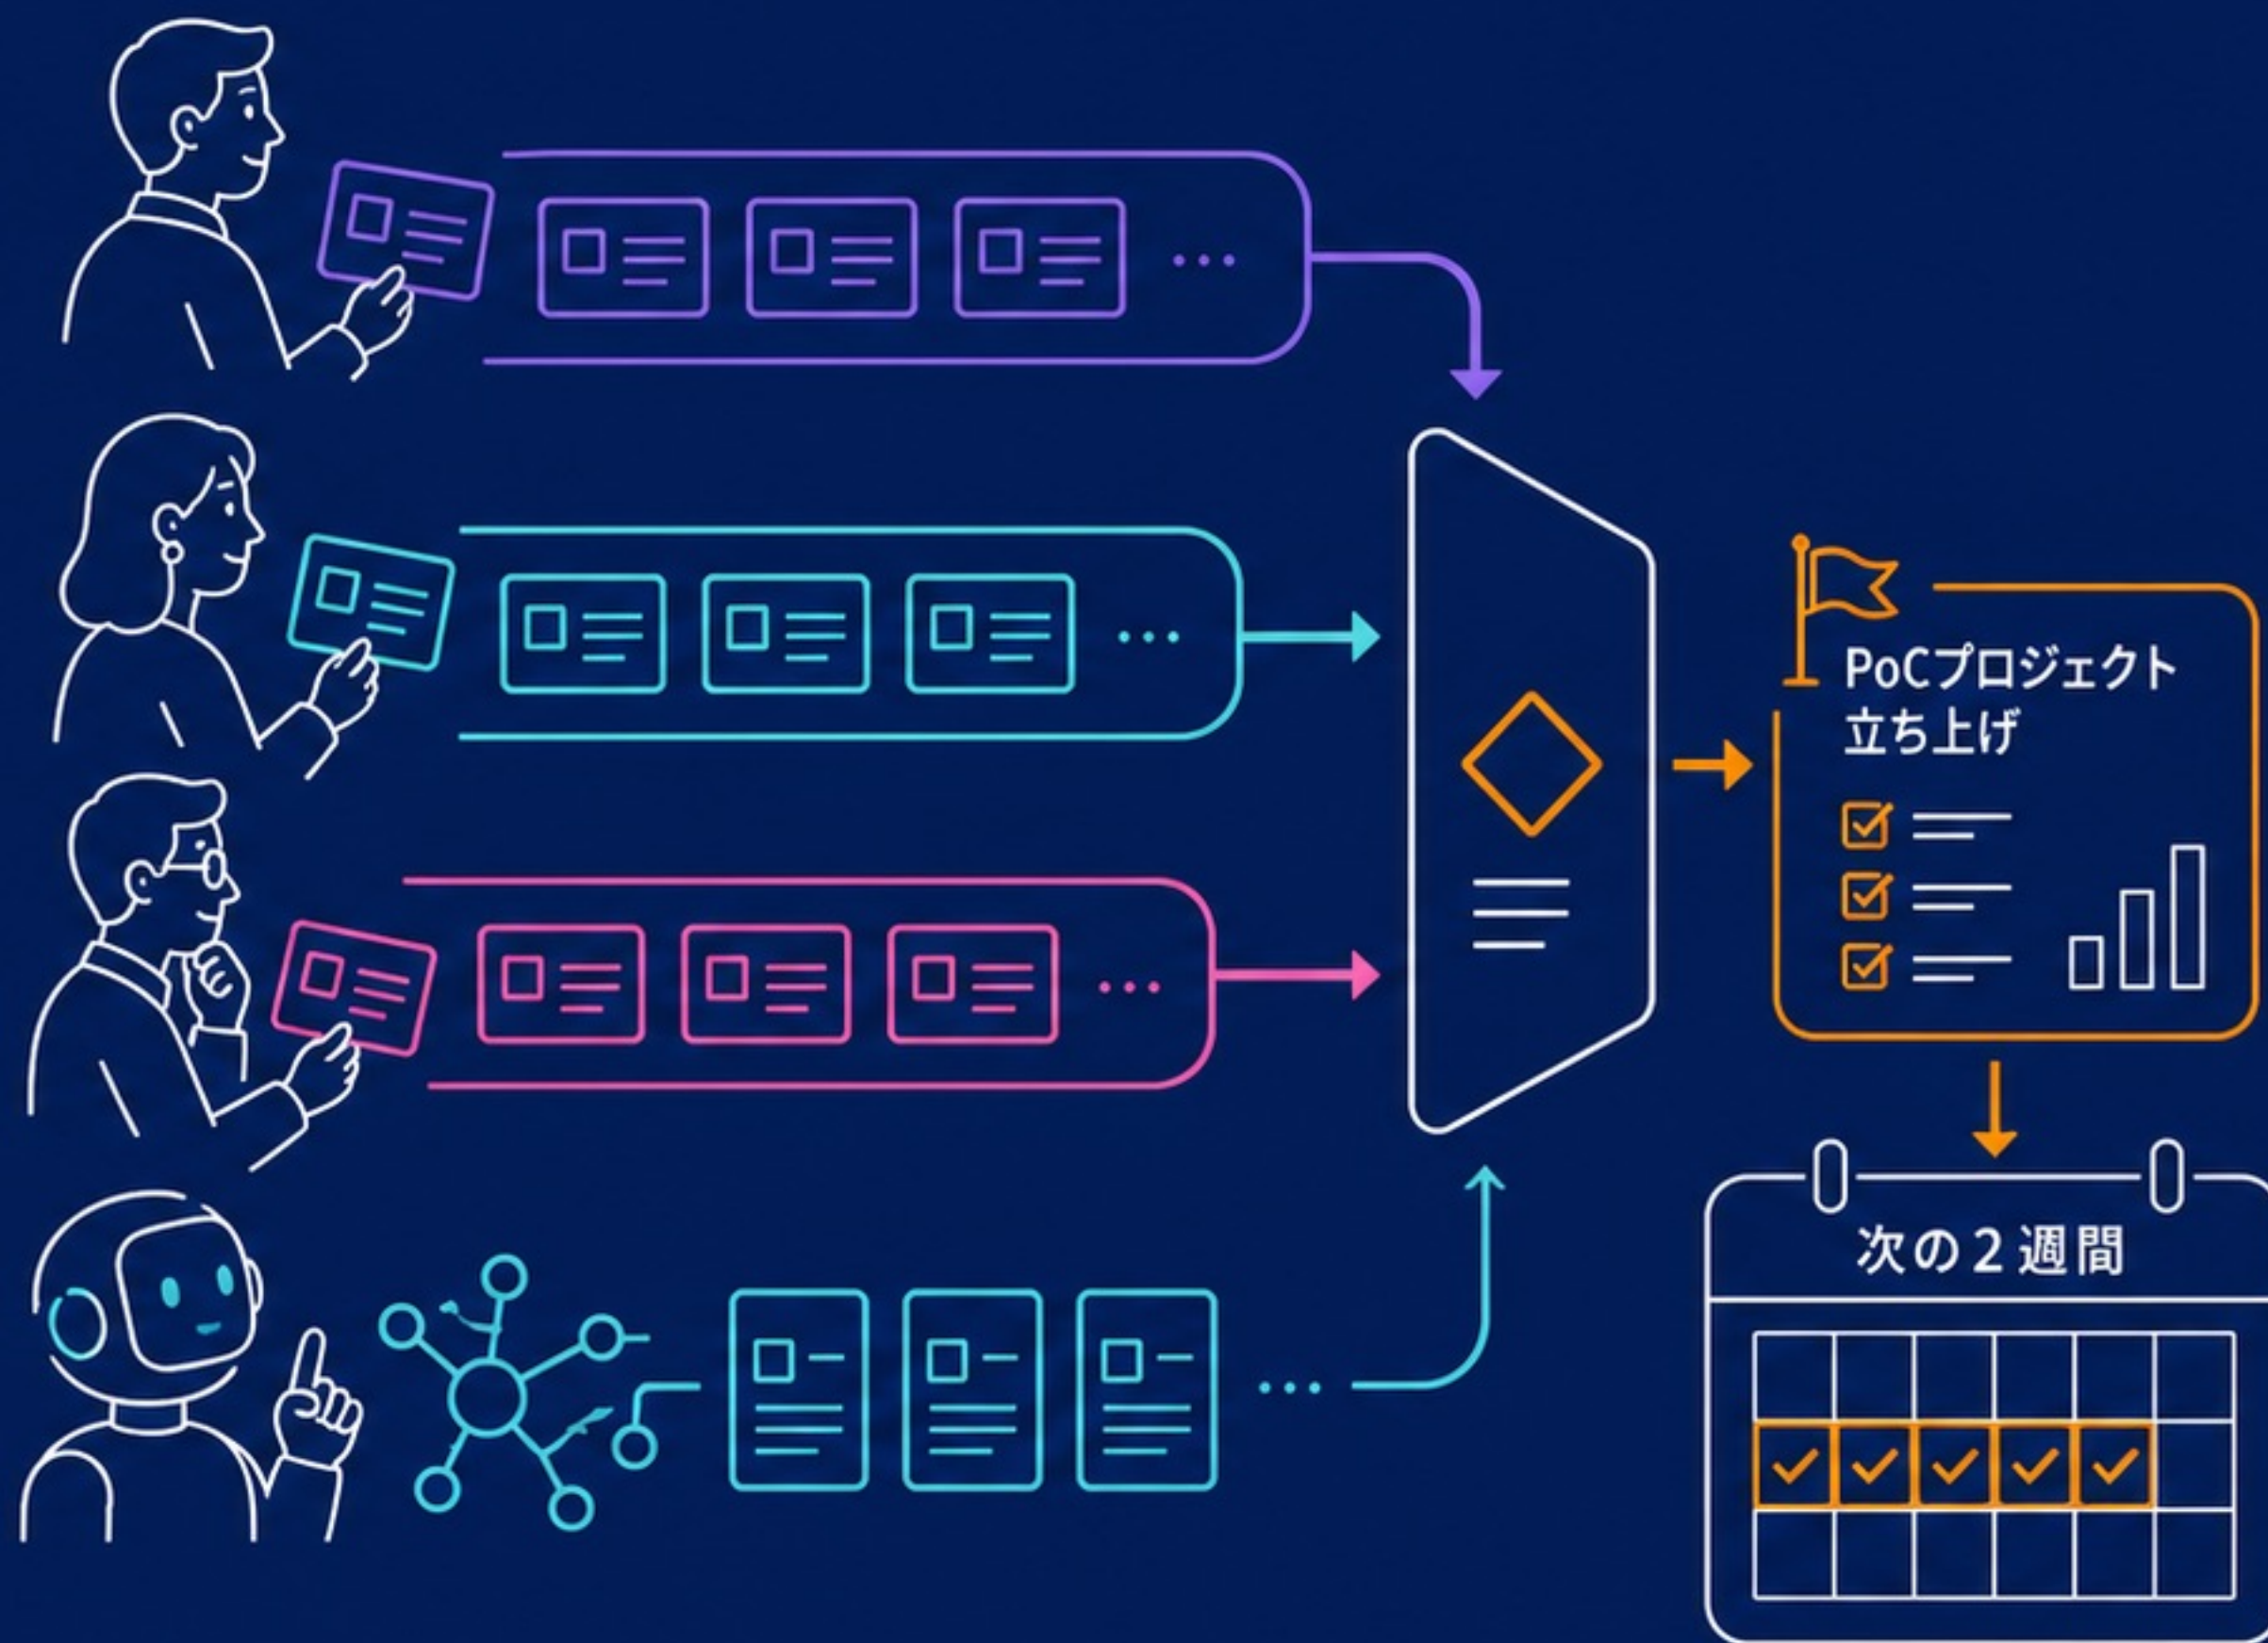


今日の到達点

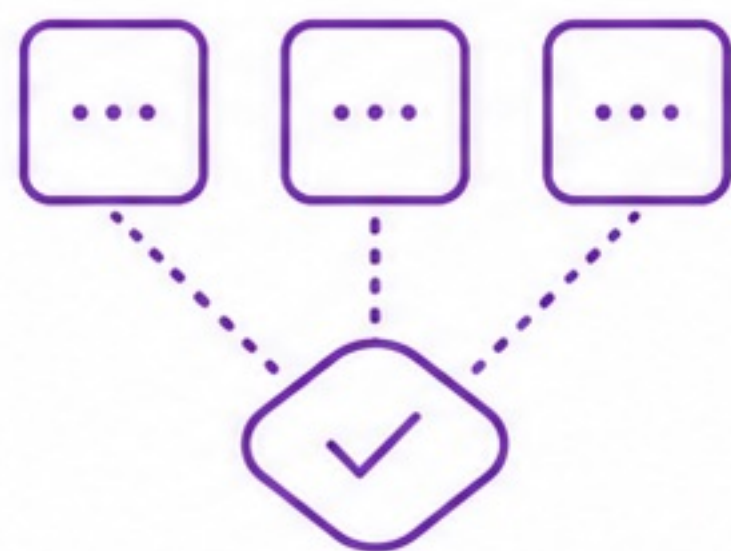

01

最大3件のPoC候補を選ぶ



02

『誰の何がどう変わるか』を
定義する




03

最初の2週間と
次の判断日を決める

説明を聞く回ではなく、プロジェクトを立ち上げる回

第1回の『業務分解』を、第2回は『プロジェクト設計』へ

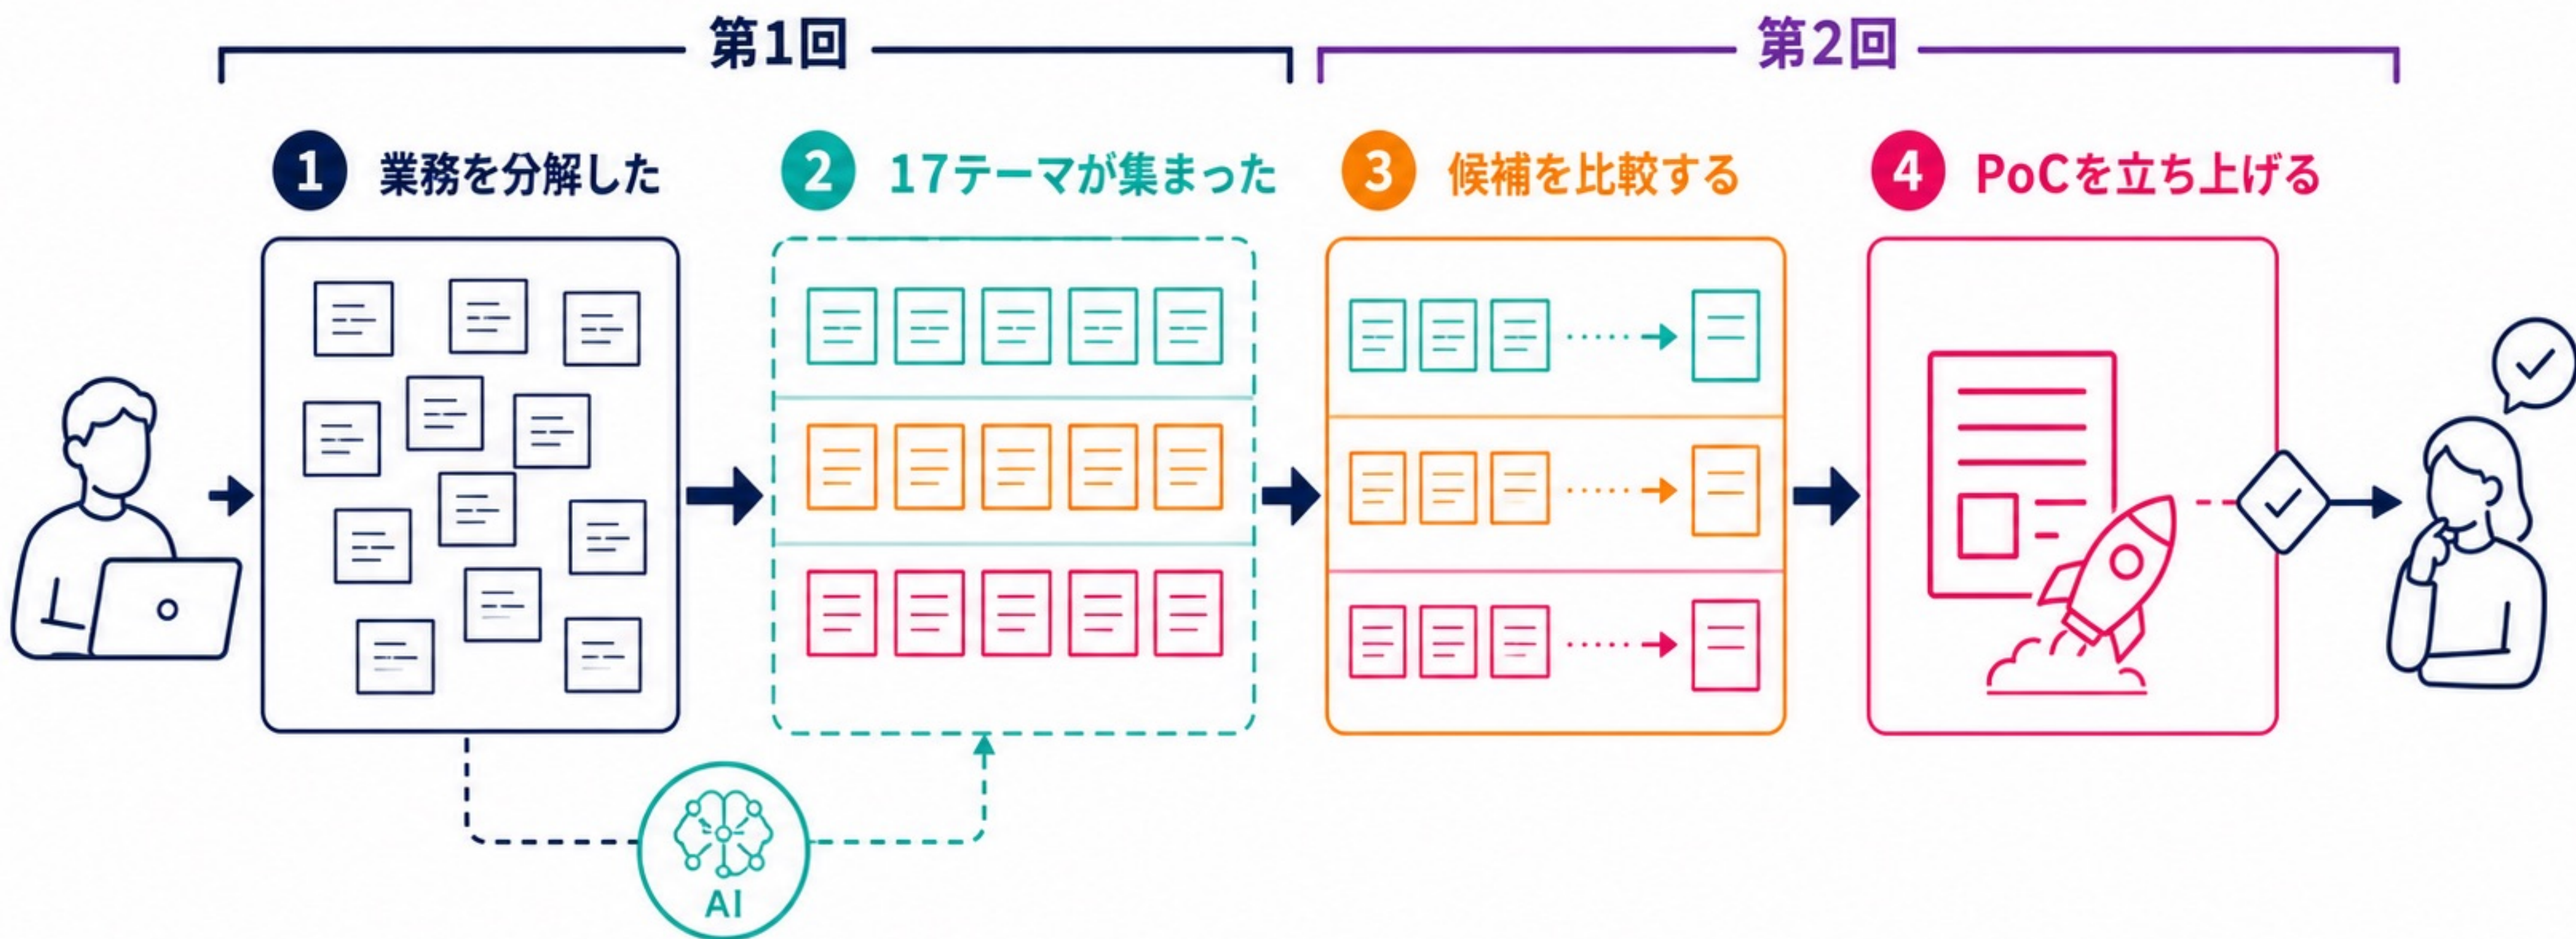

第1回：AIと人の役割を考える

第2回：成果・仮説・実験・判断を決める

17テーマは、3つの業務レーンで比較する



A 問い合わせ・ナレッジ検索

問いを分類し、根拠を探し、
回答案をつくる

FCC簡易問い合わせ／管理文書検索



B 申請・文書チェック

ルールと照らし、不備を見つけ、
指摘案をつくる

東日本DCS入館申請／申請書チェック



C 手順・文書の作成とレビュー

不足や差分を見つけ、
実行可能な文書にする

運用手順書の作成・レビュー

3レーンから1件ずつ選ぶ必要はない。安全に測定できるテーマを優先する

立ち上げは「作るもの」ではなく「変える成果」から



小さなPoCで、運用自律化への判断基盤をつくる


1 安全に測れる業務で試す

問い合わせ／申請／手順書




2 判断ログと学びを束ねる

複数PoCをAI駆動PMOで運営

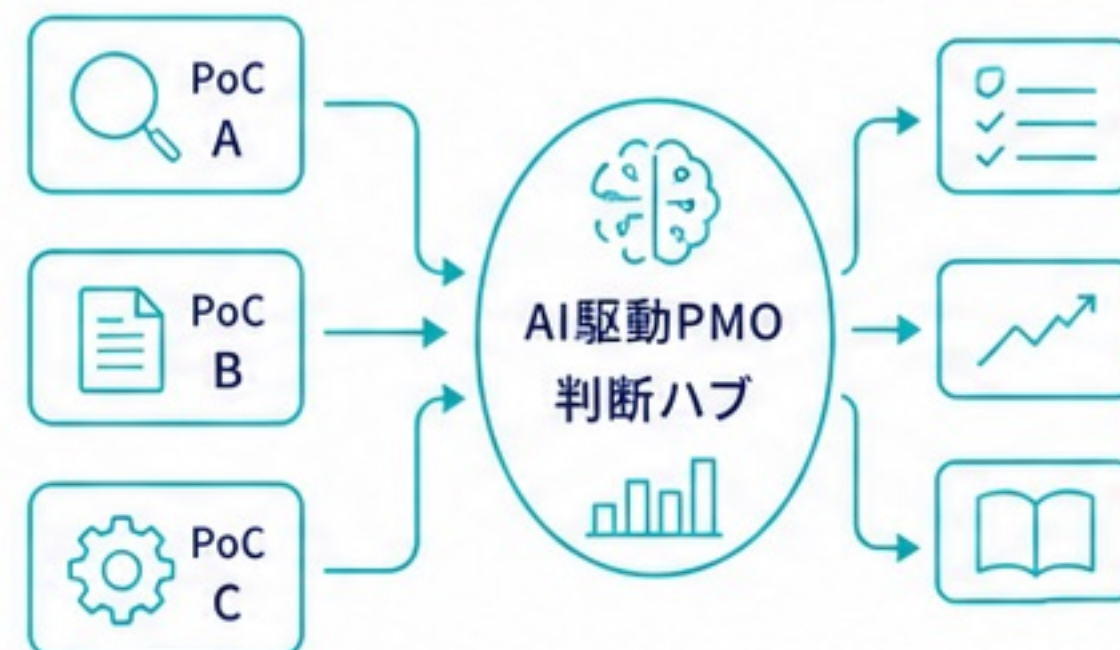

3 運用業務へ段階的に広げる

障害予見／障害対応支援／運用自律化

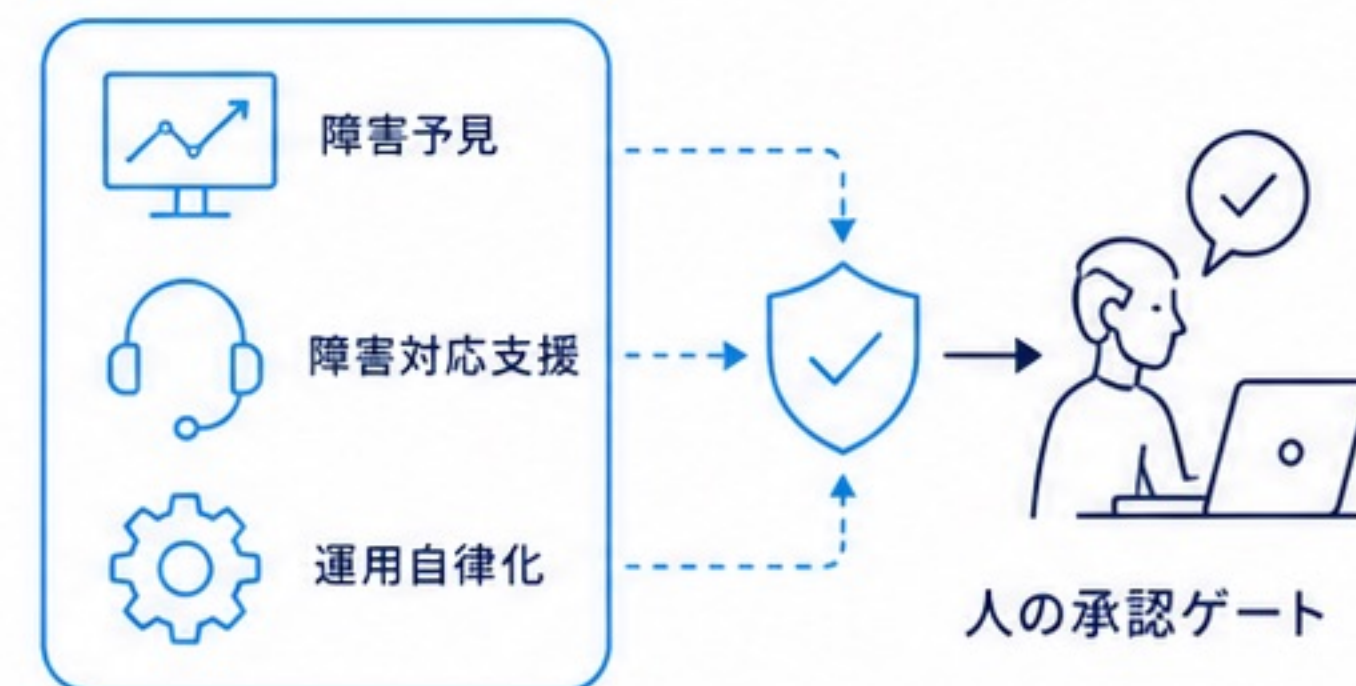


本番ログを使う自律化は、初回PoCの対象外

PoC立ち上げは、6つの判断を順番に置く

01

アウトカムを1文にする

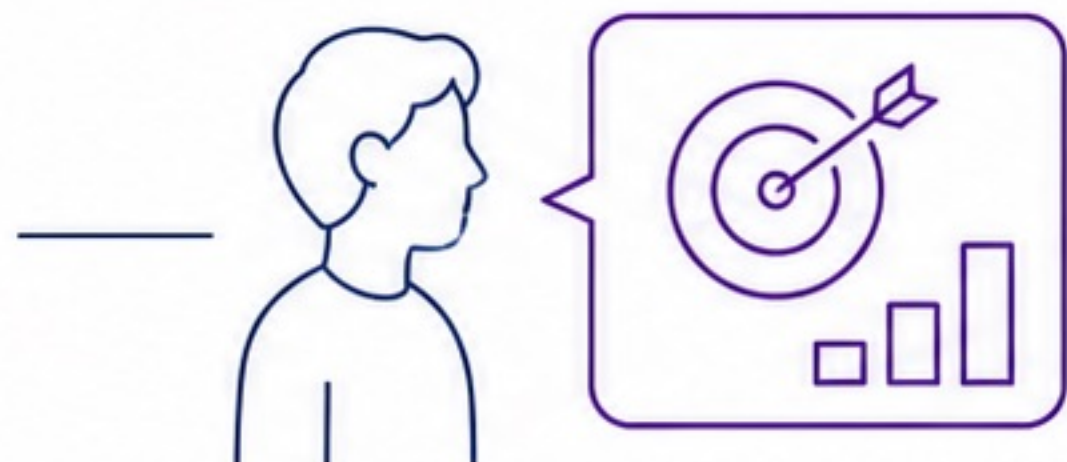


02

重要仮説を並べる



03

関係者と責任分界を決める

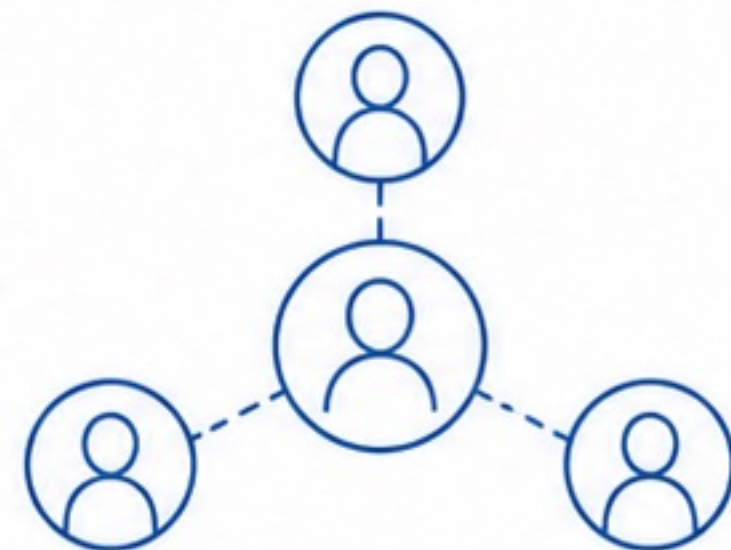

04

最初の実験を切る




05

失敗を先回りする



06

意思決定の周期を固定する

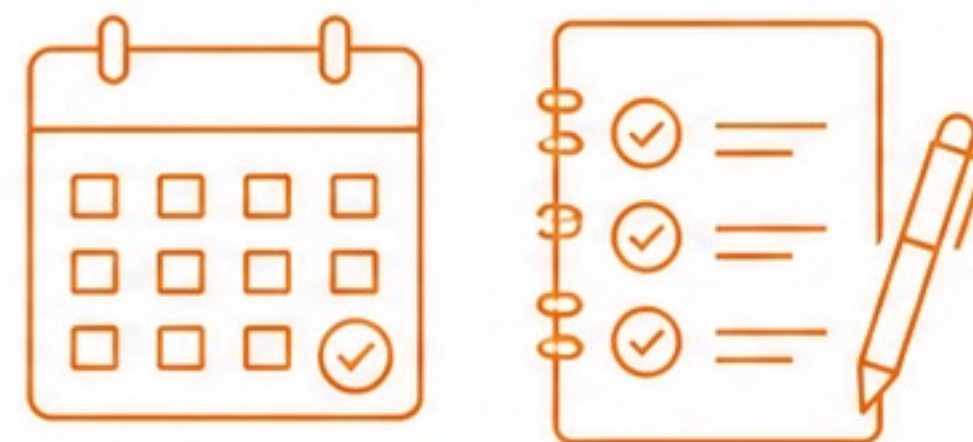

最初に試すのは、 外れた時に痛い仮説


何から検証するか。

影響が大きい × 確信度が低い

一番作りやすい機能から始めない



関係者は、役職ではなく「決めること」で分ける

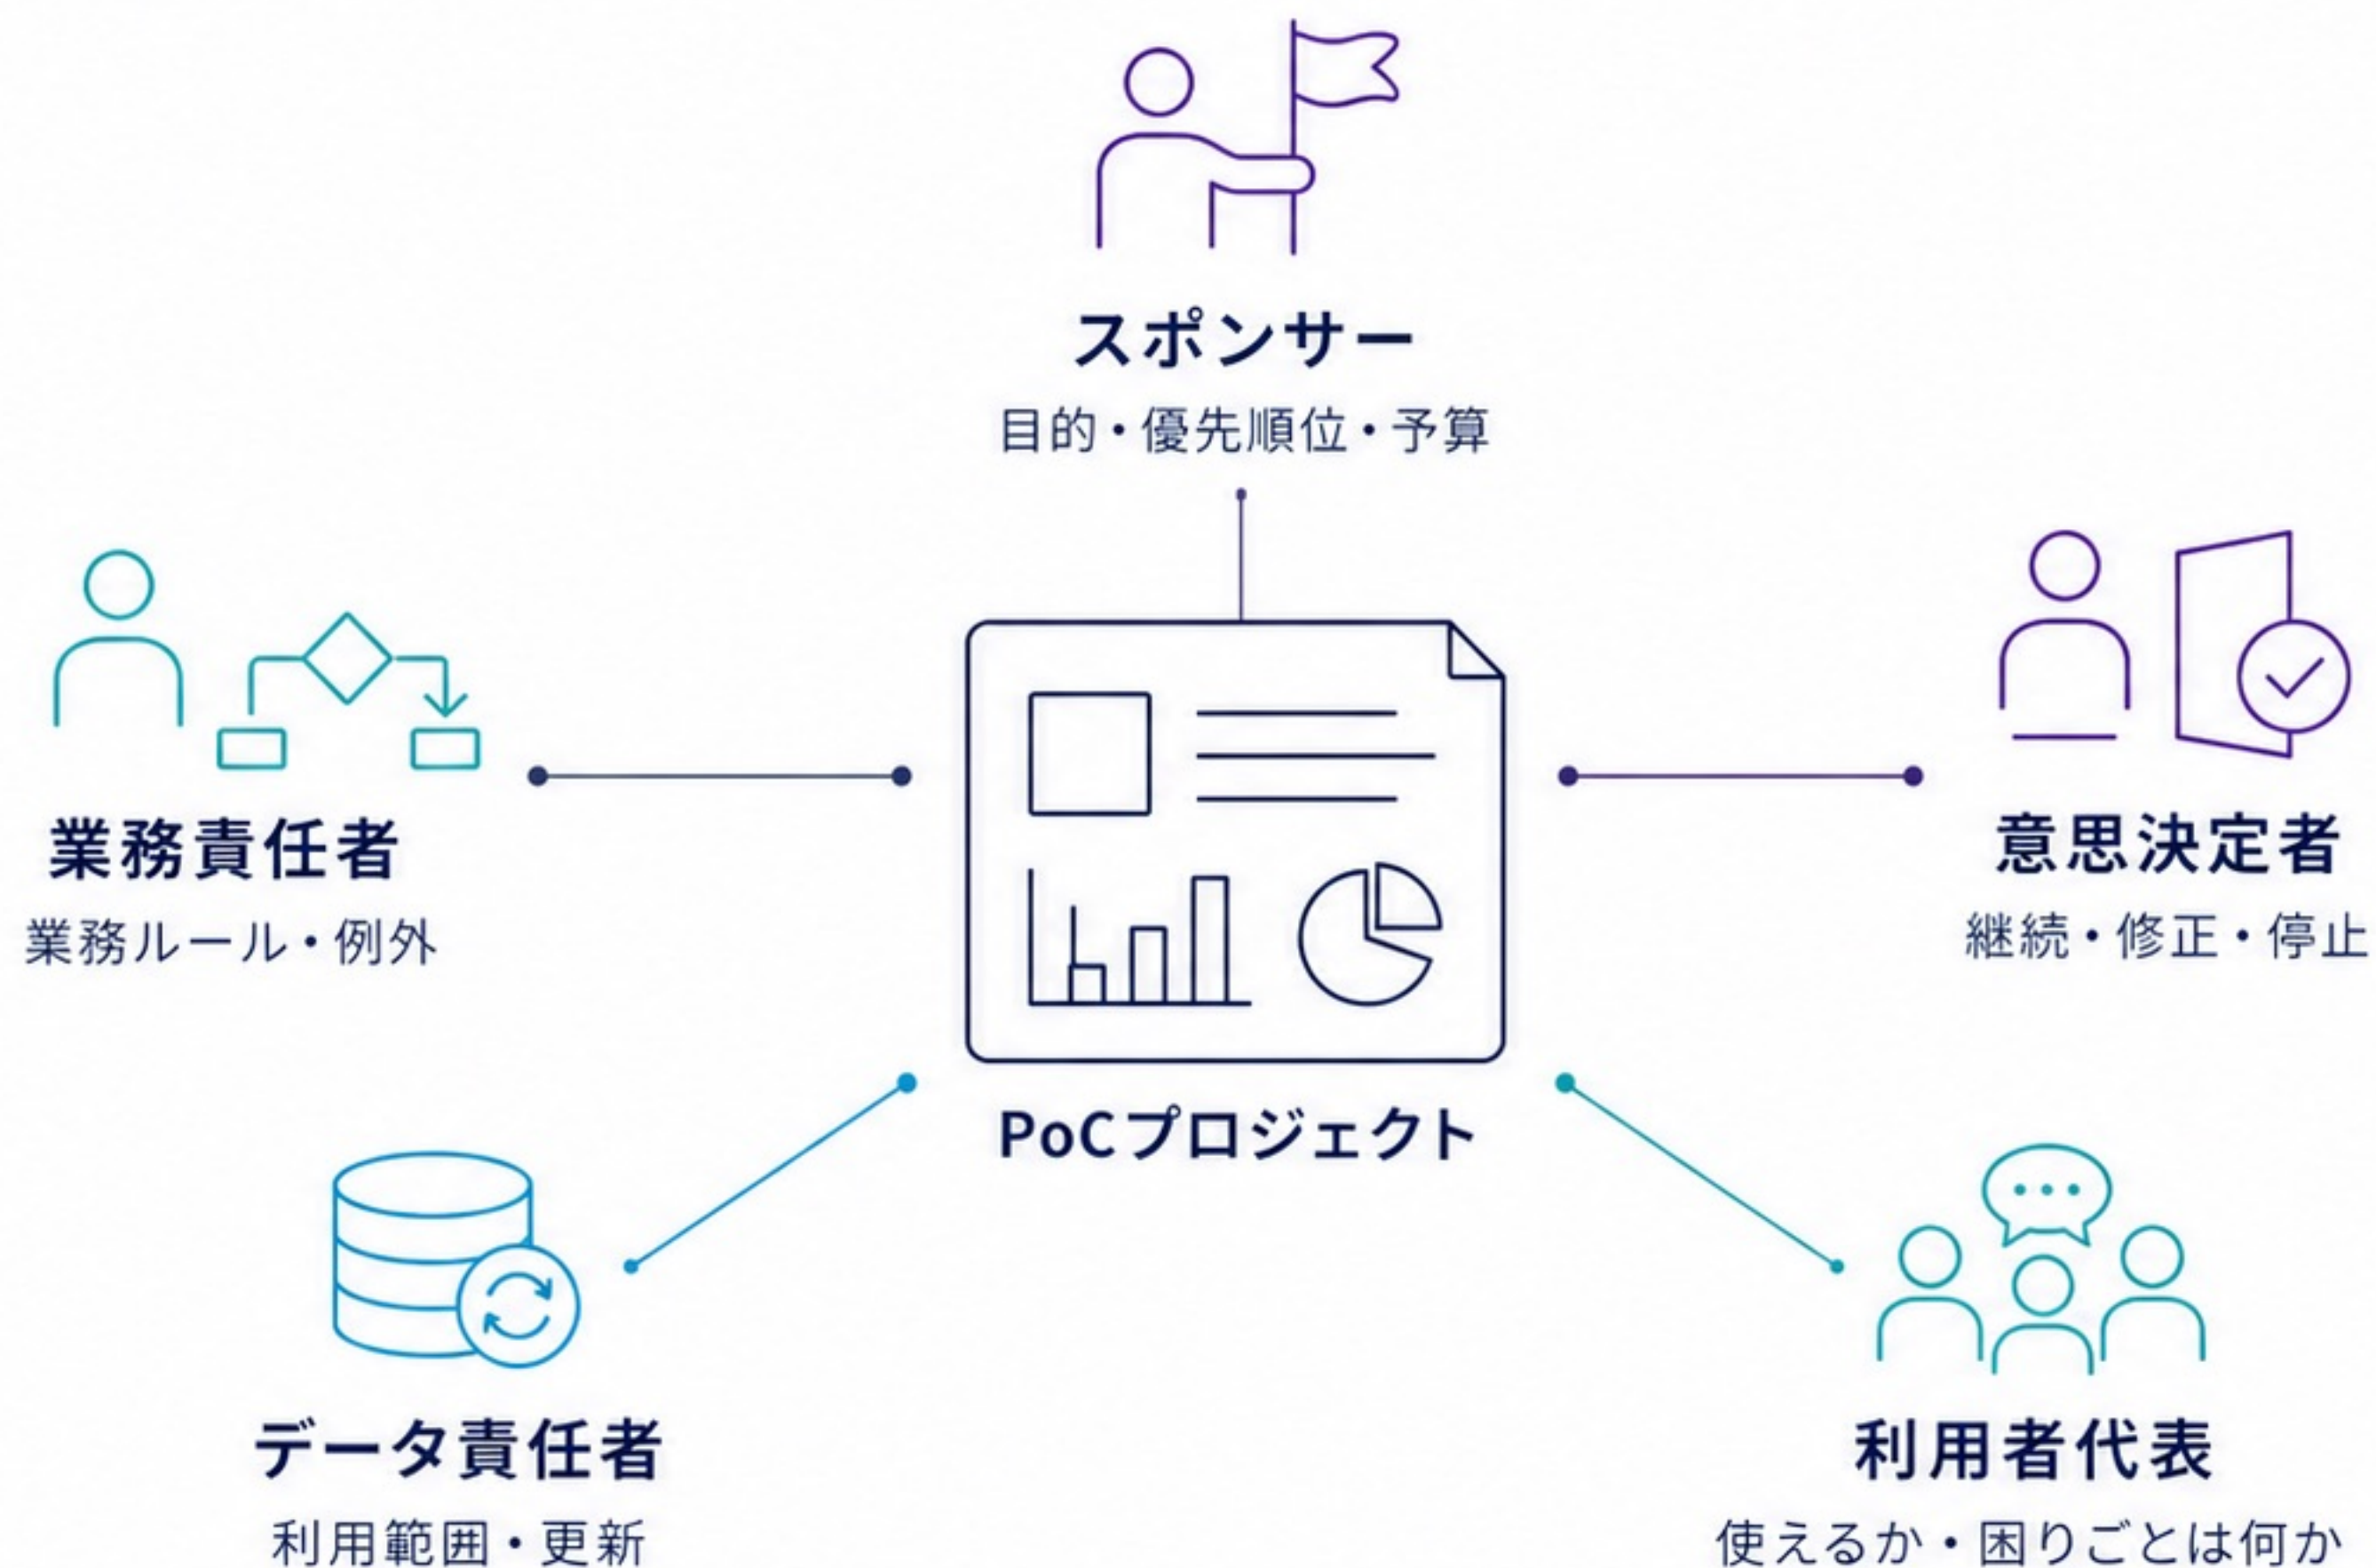

AIは論点を整理する。承認と例外判断は人が担う

PoC候補は、5基準で比較する

合計100



安全性または検証可能性が2点以下なら、一旦保留

ケース：入館申請15分を、どこまで安全に減らせるか

月**235**件


現行**15**分／件



→ 目標**8**分／件


① マクロ

転記・形式統一

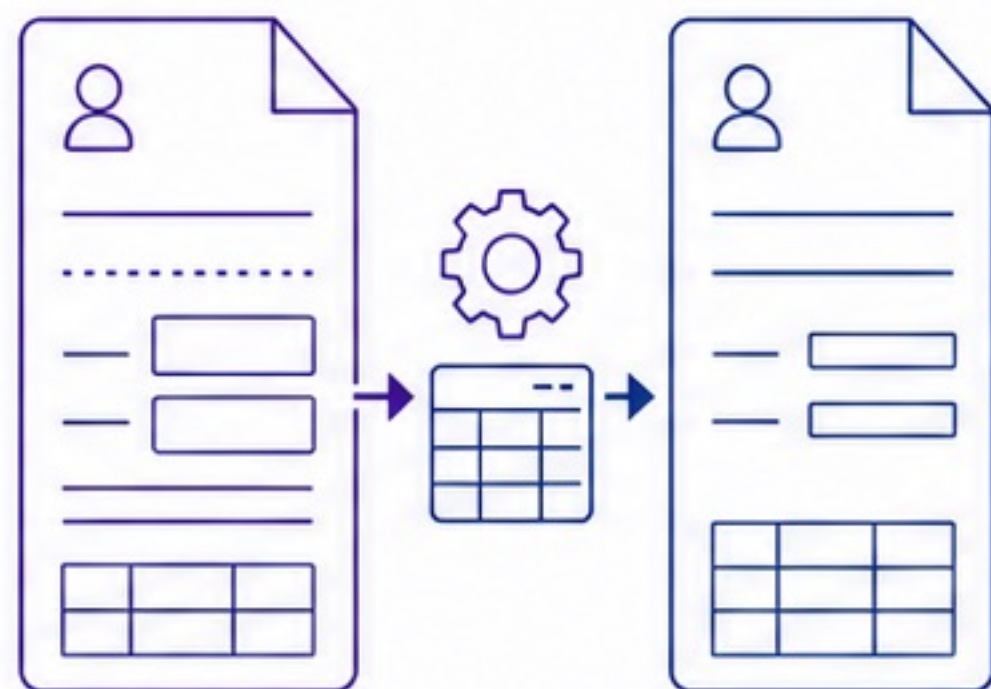

② AI

表記ゆれ・自由記述の
不備候補と返信案

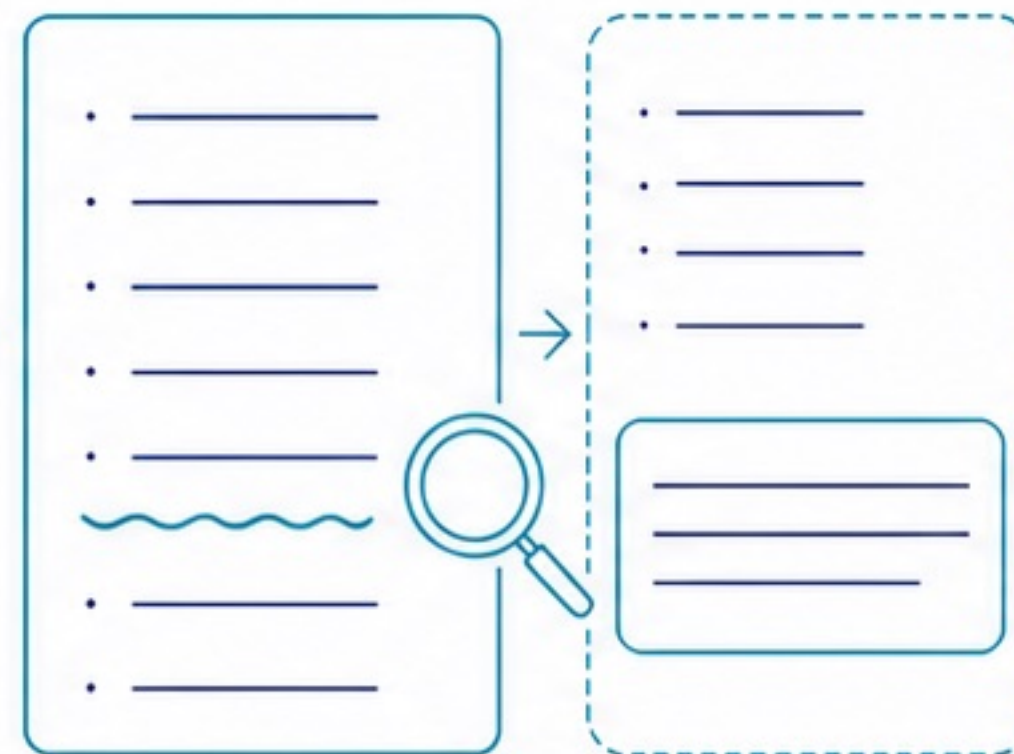

③ 人

最終判定・例外処理・送信



見逃し率と過剰指摘率を分けて測る



見逃し率

本来指摘すべき不備を
見逃した割合




過剰指摘率

問題ない項目を
誤って指摘した割合




目標値は提出時点の仮説。PoCで実測する

20件で、成功だけでなく停止条件も決める

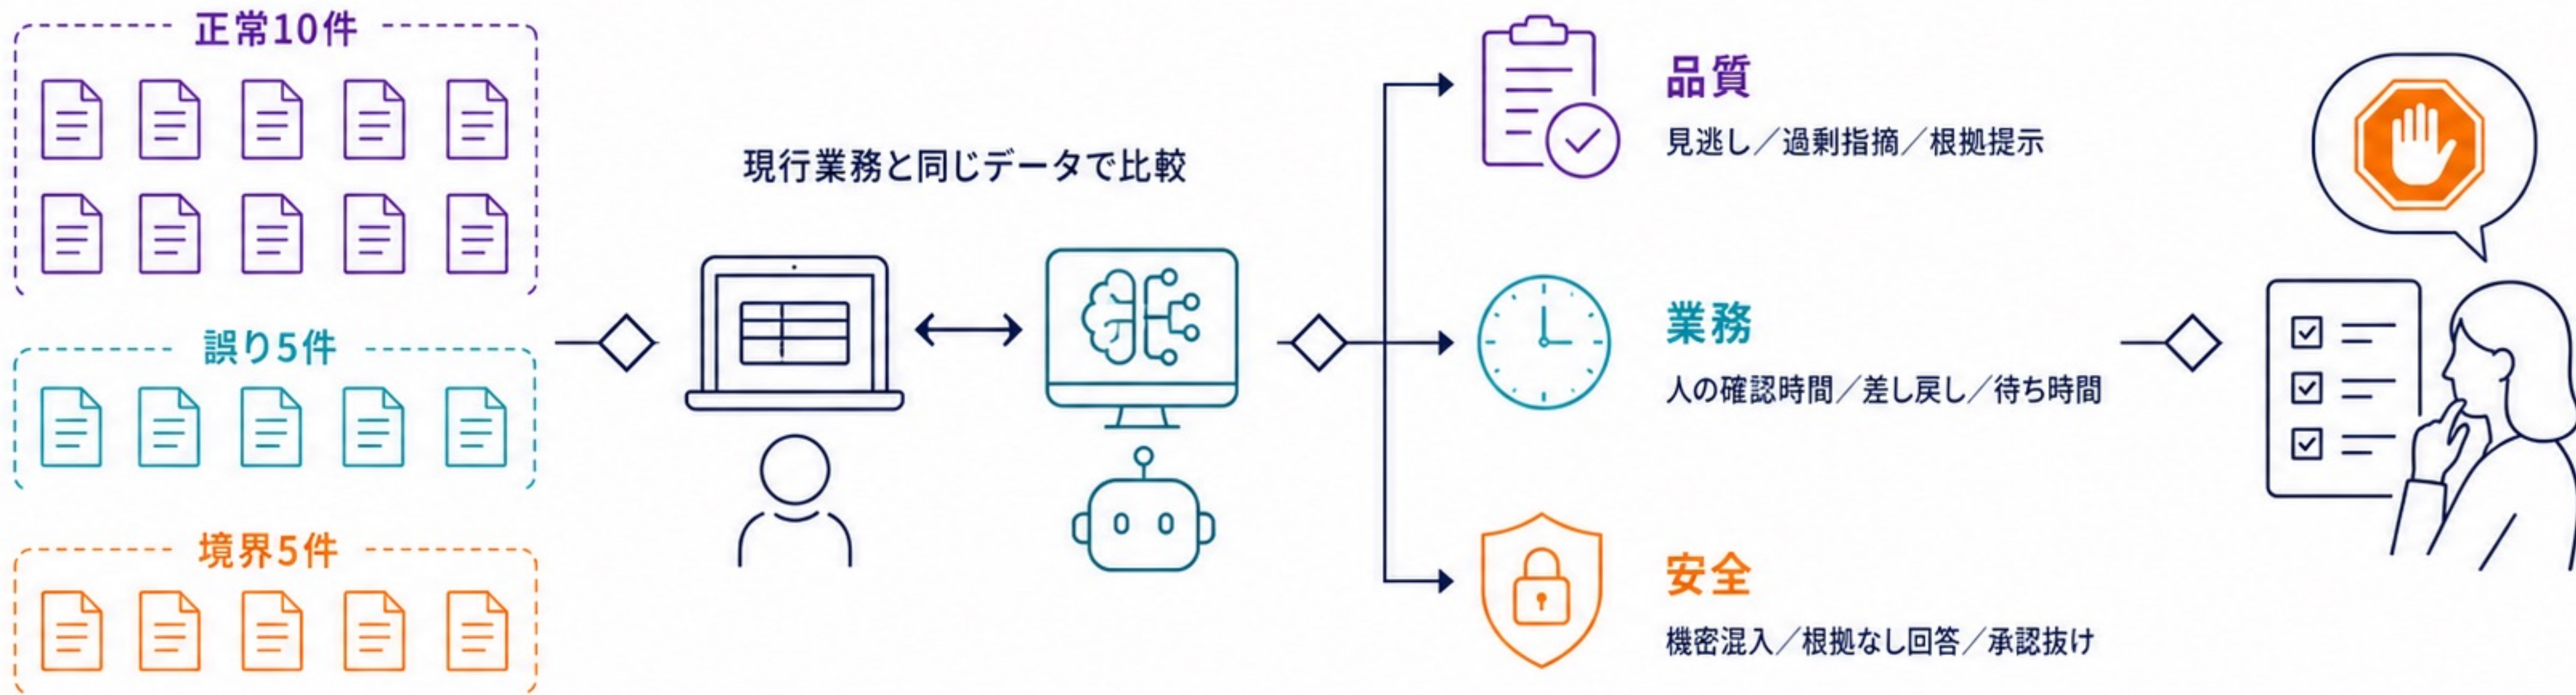

停止条件に触れたら、止めて原因を確認する

PoCは、1枚の意思決定パックで運営する

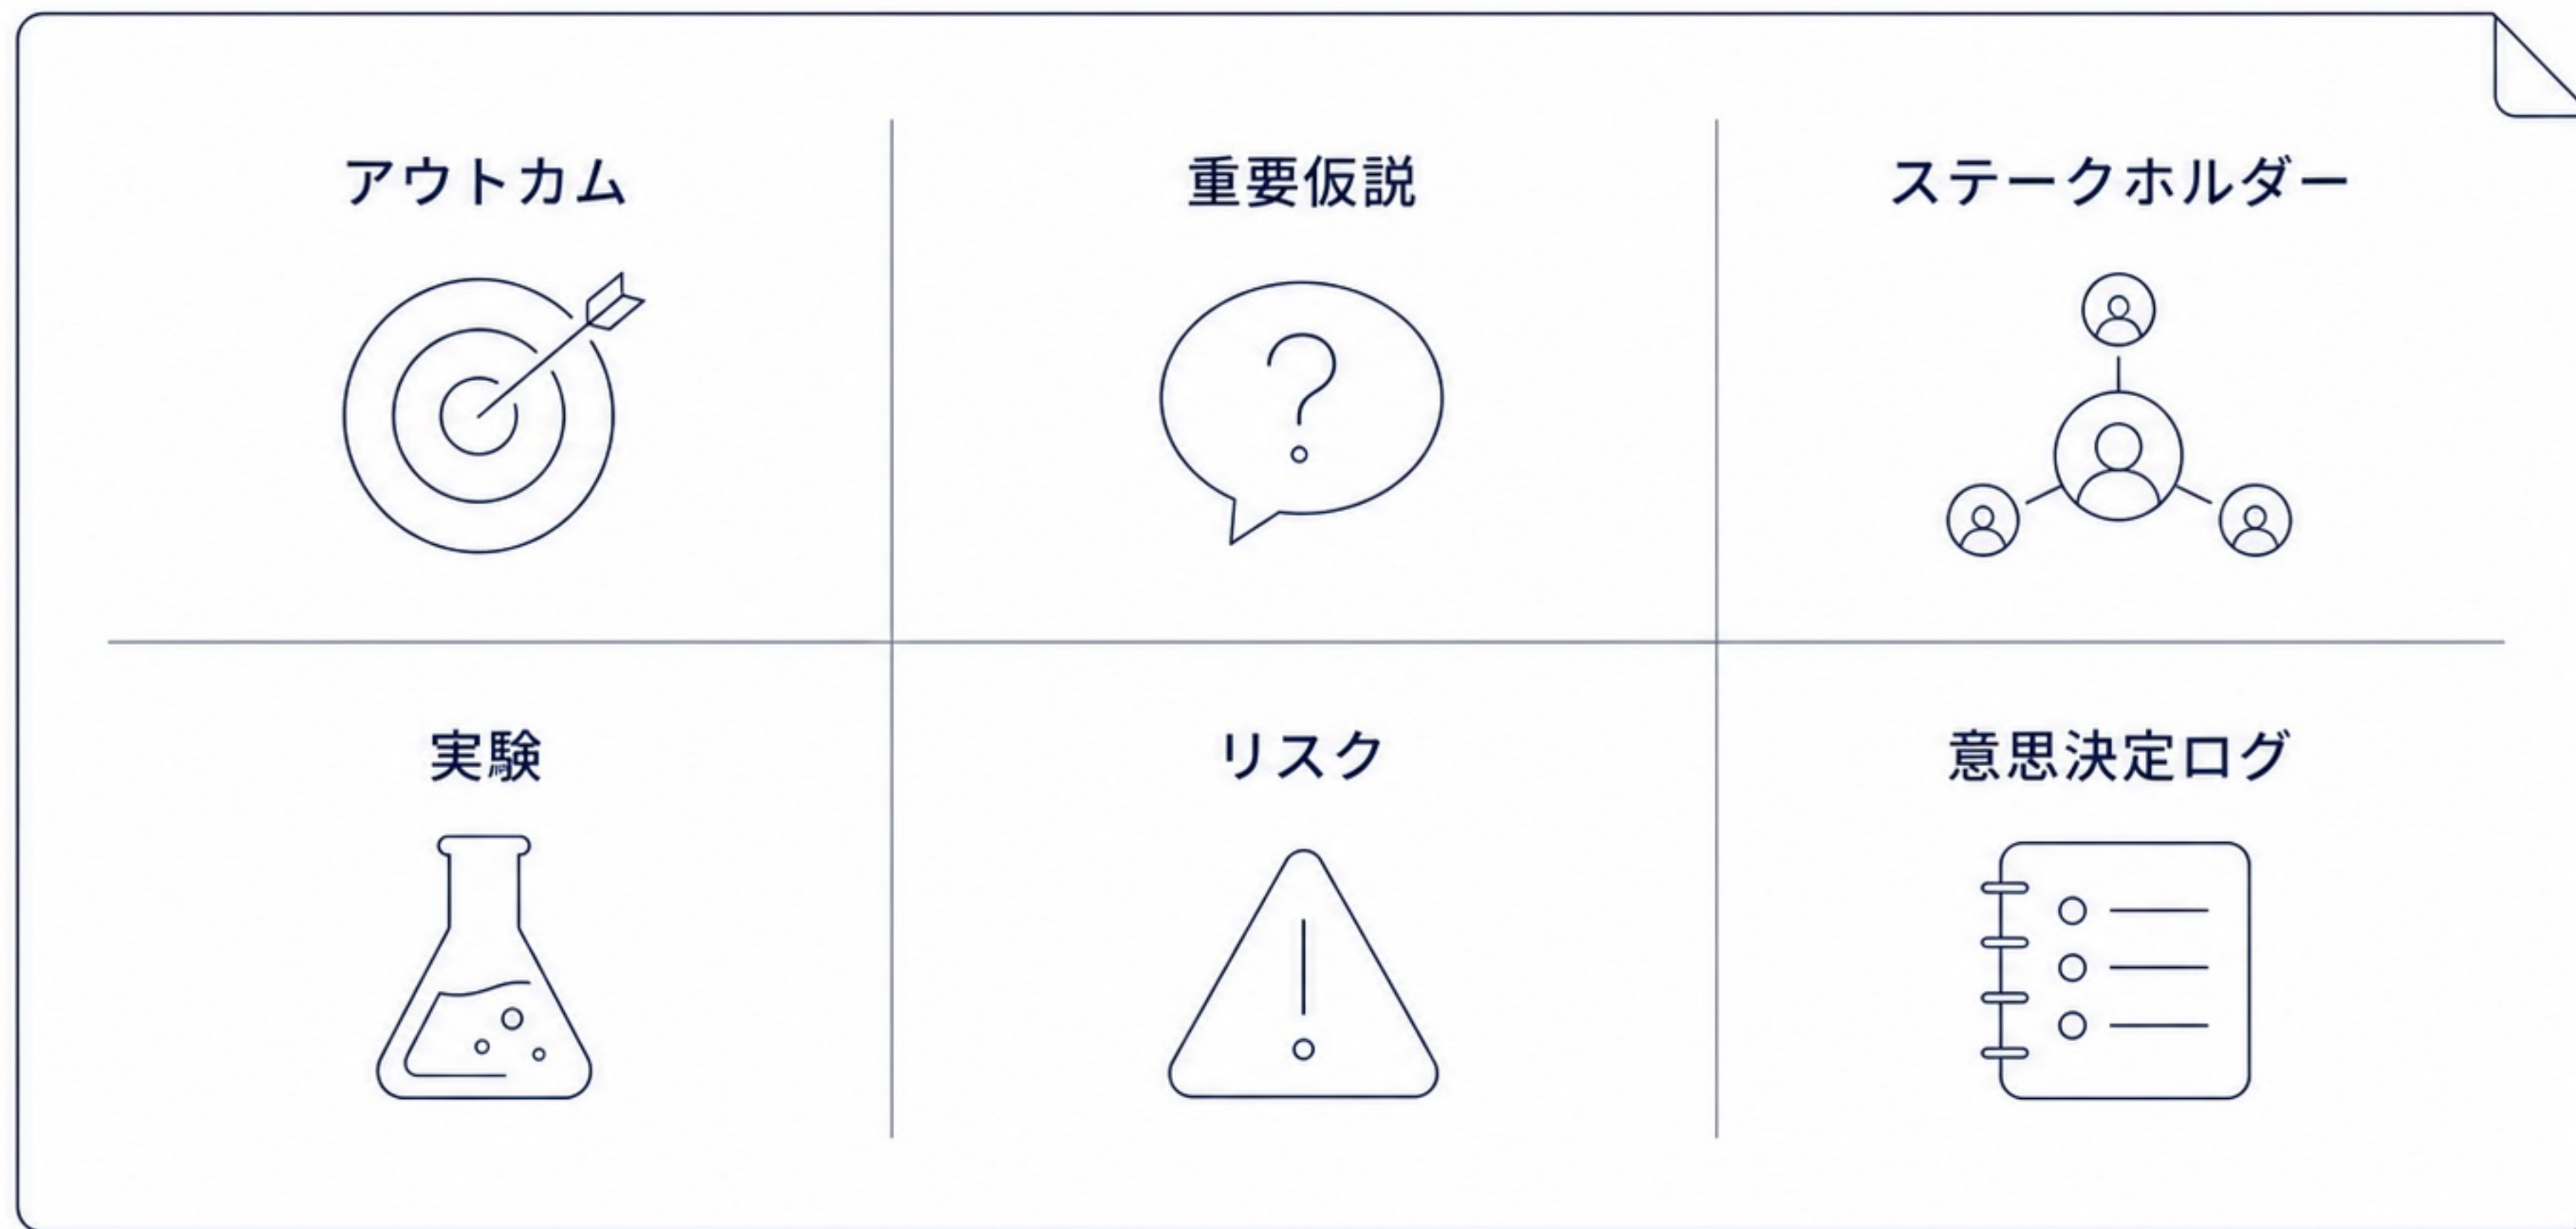

作業報告ではなく、次の判断に必要な情報を更新する

実践ワーク | 1テーマを「試せるPoC」に変える

20分


1. テーマを1件選ぶ

3分



2. AIでたたき台を作る

5分

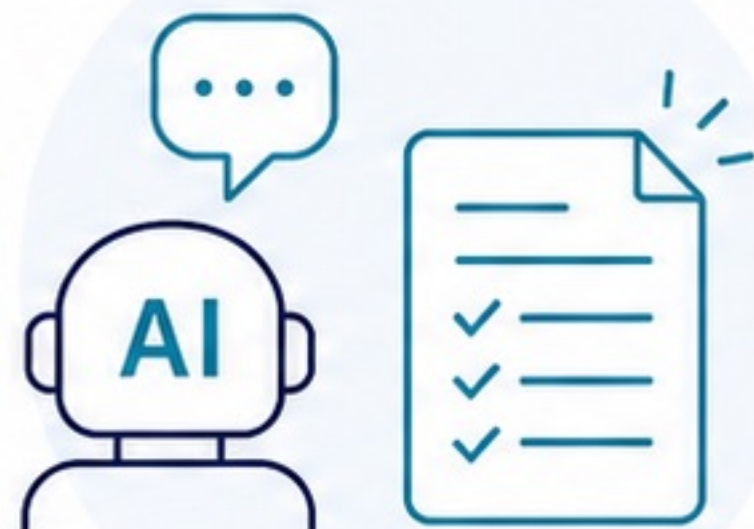


3. 人が修正する

8分



4. 1分で共有する

4分

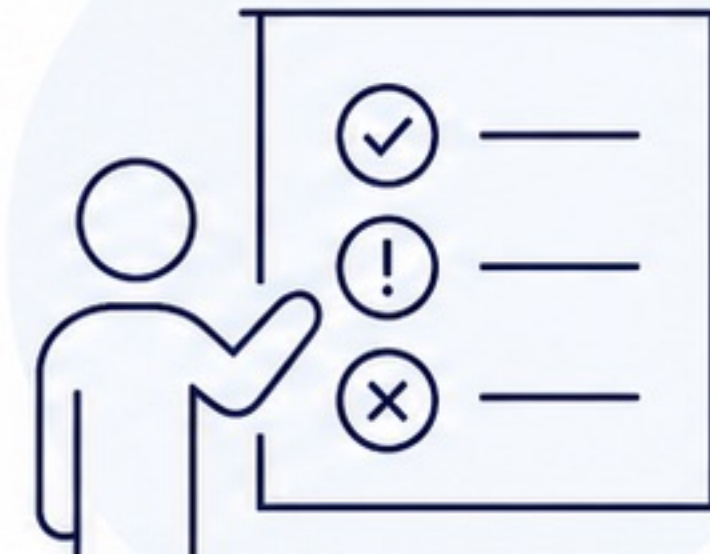


共有する3点



何を試すか



外れたら痛い仮説



何が起きたら止めるか



NECで利用承認されたAI環境のみ使用／機密・個人情報を入力しない

記入用 | 1枚のPoC意思決定パック



1 アウトカム

誰の、どの業務を、どう変えるか



2 重要仮説

外れたら計画が崩れる前提は何か



3 判断者

継続・修正・停止を決める人は誰か



4 最初の実験

正常10／誤り5／境界5



5 成功・停止条件

成功：

停止：




6 次の判断日

____ 年 ____ 月 ____ 日


AIの案をそのまま使わず、各グループで修正して完成させる

AIが週次レビューを回し、人がゲートを決める

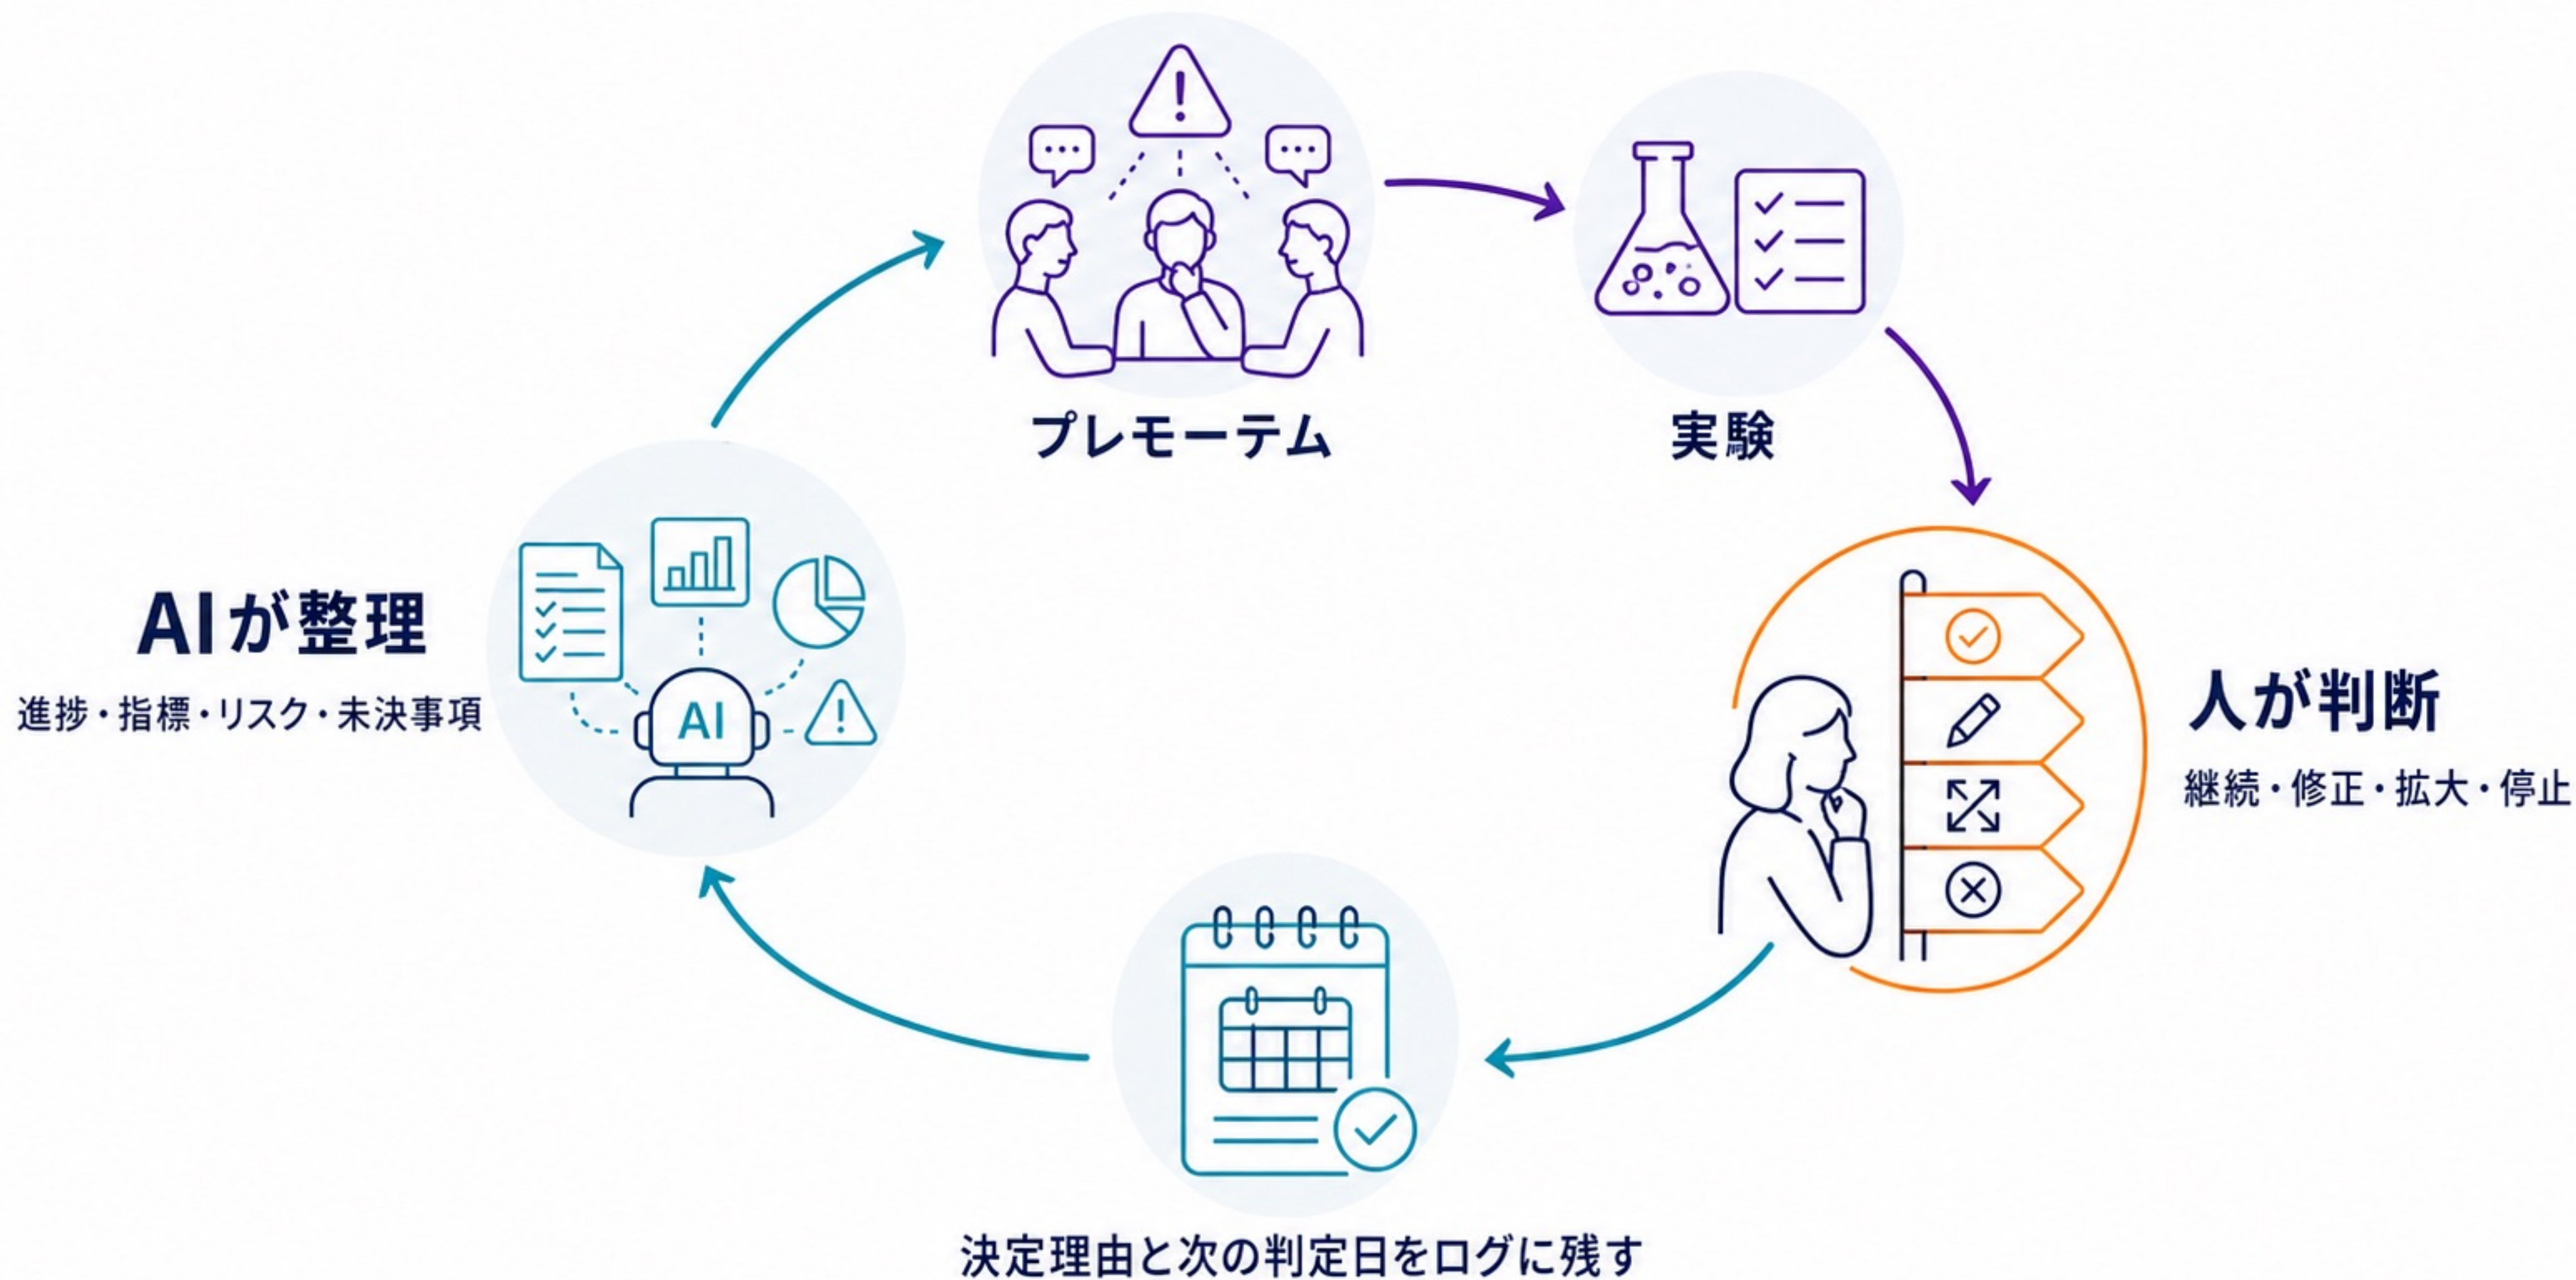

BAAOは、研修講師からAI駆動PMOへ

複数PoCの立ち上げ・週次レビュー・リスク・判断を支える

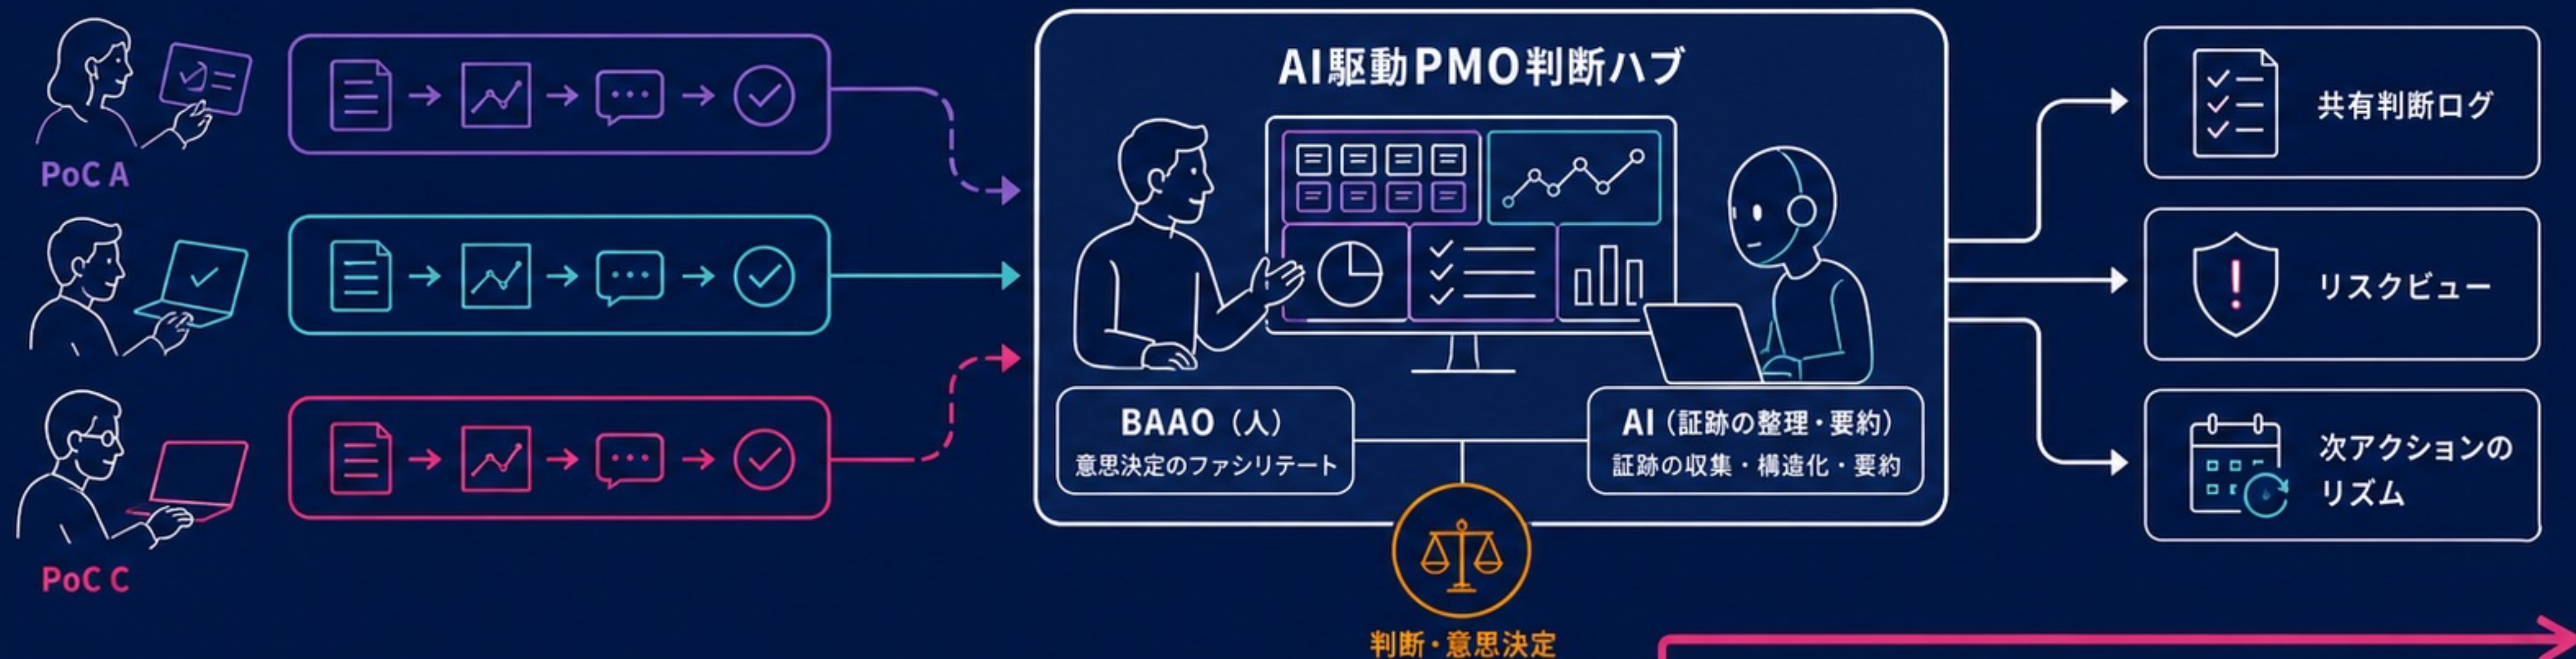

ライト支援

定期レビューと文書フィードバック



標準PMO

週次ポートフォリオレビューを運営




実行伴走

立ち上げと検証を最大0.5人月程度で支援



役割と成果物を確認してから、工数と契約条件を決める

今日から、最初の2週間を始める



担当者



テストデータ



成功・停止条件



次の判断日
